

FORMATION EN 4 MODULES

# Gestion de projet en ligne

Choisir son outil, planifier et prioriser en équipe, puis automatiser les tâches répétitives — une formation pratique en quatre étapes.

- 01**  
Les fondamentaux
- 02**  
Choisir son outil
- 03**  
Planifier, suivre, prioriser
- 04**  
Automatiser les tâches

1MODULE 1

## Les fondamentaux de la gestion de projet

Comprendre le cycle de vie d'un projet avant de choisir ses outils.

1MODULE 1 — FONDAMENTAUX

## Le cycle de vie d'un projet

Un projet est un ensemble d'actions temporaires, avec un début et une fin, mené pour atteindre un objectif précis dans des délais et un budget donnés.


| 01                                                                                           | 02                                                                                                       | 03                                                                              | 04                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Initier</b><br><br>Définir l'objectif, les parties prenantes et la faisabilité du projet. | <b>Planifier</b><br><br>Découper le travail en tâches, estimer les délais et les ressources nécessaires. | <b>Exécuter</b><br><br>Réaliser les tâches et coordonner l'équipe au quotidien. | <b>Clôturer</b><br><br>Livrer, évaluer les résultats et capitaliser sur les apprentissages. |

1MODULE 1 — FONDAMENTAUX

## L'équilibre du projet et les rôles clés

Le triangle qualité-coût-délai

Modifier l'un de ces trois axes impacte toujours les deux autres. Un bon outil aide à visualiser cet équilibre en continu.

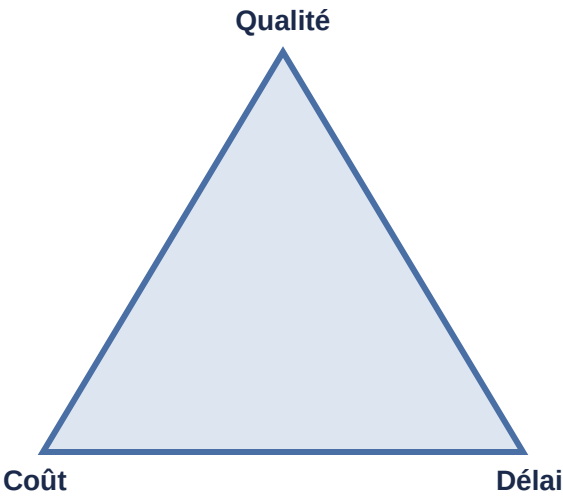

Les rôles clés dans un projet

- **Sponsor / commanditaire**  
Porte les objectifs stratégiques et débloque les ressources.
- **Chef de projet**  
Planifie, coordonne et arbitre au quotidien.
- **Équipe projet**  
Réalise les tâches et fait remonter les blocages.
- **Parties prenantes**  
Utilisateurs et contributeurs impactés par le résultat.

2 MODULE 2

Choisir son outil de gestion de projet

Des critères objectifs pour éviter l'outil par défaut ou par habitude.

2 MODULE 2 — CHOISIR SON OUTIL

Cinq critères pour choisir son outil

01

**Taille de l'équipe**  
Un outil simple pour 3 personnes devient vite limité à 30.

02

**Complexité des projets**  
Dépendances, jalons multiples : certains outils gèrent mieux la charge.

03

**Budget disponible**  
Coût par utilisateur et fonctionnalités réservées aux offres payantes.

04

**Intégrations nécessaires**  
Connexion avec messagerie, calendrier, code, facturation...

05

**Courbe d'apprentissage**  
Un outil puissant mais complexe risque d'être sous-utilisé par l'équipe.

2 MODULE 2 — CHOISIR SON OUTIL

# Étude comparative des outils du marché

Cinq solutions parmi les plus utilisées, comparées sur leur usage cible, leurs forces et leurs limites.

| Outil      | Idéal pour                    | Points forts                       | Limites                                 | Tarif indicatif          |
|------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Trello     | Petites équipes, usage simple | Kanban visuel, très intuitif       | Peu adapté aux projets complexes        | Gratuit → 5 €/mois       |
| Asana      | Équipes marketing / produit   | Vues multiples, automatisations    | Interface riche, courbe d'apprentissage | Gratuit → 10,99 €/mois   |
| monday.com | Équipes multi-métiers         | Très visuel, personnalisable       | Prix qui grimpe avec les options        | Dès 9 €/mois/utilisateur |
| Jira       | Équipes techniques / dev      | Suivi agile poussé (Scrum, Kanban) | Configuration complexe                  | Gratuit → 7,75 €/mois    |
| Notion     | Docs + projets combinés       | Très flexible, tout-en-un          | Gestion de projet moins structurée      | Gratuit → 10 €/mois      |

Tarifs indicatifs relevés au moment de la formation — à vérifier avant tout engagement.

2

MODULE 2 — CHOISIR SON OUTIL

## Quel outil pour quel profil d'équipe ?

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Petite équipe / freelances</p> <p><b>Trello ou Notion</b></p> <p>Mise en place en quelques minutes, pas de configuration lourde.</p> | <p>Équipe produit ou marketing</p> <p><b>Asana ou monday.com</b></p> <p>Vues multiples (liste, calendrier, charge) et automatisations natives.</p> | <p>Équipe technique / développement</p> <p><b>Jira</b></p> <p>Sprints, backlog et intégration native avec les outils de code.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3

MODULE 3

## Planifier, suivre et prioriser en équipe

Des méthodes concrètes pour garder le rythme sans perdre le cap.

3

MODULE 3 — PLANIFIER, SUIVRE, PRIORISER

## Planifier : du découpage au diagramme de Gantt

01

Découper en tâches (WBS)

Décomposer le projet en livrables, puis en tâches suffisamment petites pour être estimées et assignées.

02

Identifier dépendances et jalons

Repérer les tâches bloquantes et poser des jalons de contrôle réguliers.


03

Visualiser sur un Gantt


La plupart des outils (Asana, monday.com, Jira) génèrent le Gantt automatiquement à partir des tâches et de leurs dates.

Suivre l'avancement au fil de l'eau

Un tableau Kanban permet de visualiser en un coup d'œil où en est chaque tâche.

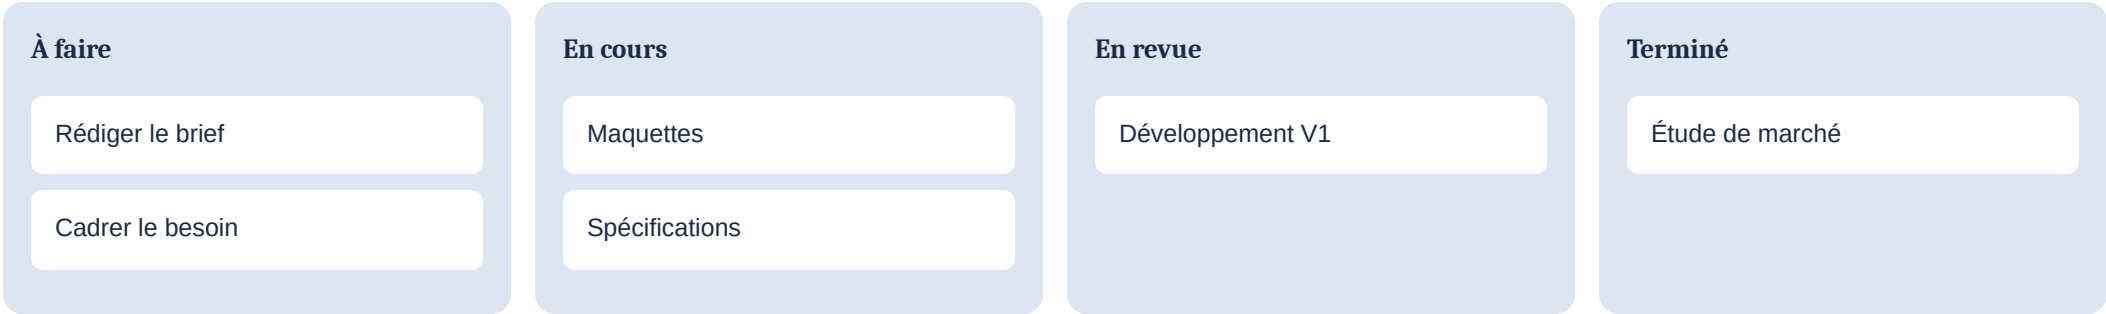

Indicateurs à suivre en équipe



Prioriser en équipe

Matrice d'Eisenhower

|                                                                    |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <div>Urgent &amp; important</div> <div>À faire immédiatement</div> | <div>Important, pas urgent</div> <div>À planifier</div>               |
| <div>Urgent, pas important</div> <div>À déléguer</div>             | <div>Ni urgent ni important</div> <div>À reporter ou abandonner</div> |

Méthode MoSCoW

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <div>Must have</div> <div>Indispensable au succès du projet.</div>  |
| <div>Should have</div> <div>Important mais non bloquant.</div>      |
| <div>Could have</div> <div>Souhaitable si le temps le permet.</div> |

Won't have  
Exclu de cette itération.

3 MODULE 3 — PLANIFIER, SUIVRE, PRIORISER

# Les rituels qui font vivre la planification

**Daily / point quotidien**  
Tous les jours, 15 min  
Chacun partage ce qui avance, ce qui bloque, ce qui vient.

**Revue hebdomadaire**  
Chaque semaine, 30 min  
Vérifier l'avancement global par rapport au planning et ajuster les priorités.

**Rétrospective**  
Fin de sprint / de phase  
Identifier ce qui a bien fonctionné et ce qui peut être amélioré.

**Revue de jalon**  
À chaque étape clé  
Valider un livrable avec le sponsor avant de passer à la suite.

4 MODULE 4

# Automatiser les tâches répétitives

Libérer du temps pour le travail à forte valeur ajoutée.

4 MODULE 4 — AUTOMATISER

# Pourquoi automatiser les tâches répétitives ?

Chaque tâche manuelle et répétitive (relance, mise à jour de statut, rappel) est un risque d'oubli et un temps qui n'est plus consacré au travail de fond.



de temps passé sur des tâches administratives selon les retours d'équipes outillées

oubli de relance ou de mise à jour de statut grâce aux déclencheurs automatiques

les automatisations s'exécutent même en dehors des heures de travail

# Les outils pour automatiser son workflow

| Outil                   | Type                 | Ce qu'il permet                                                                   | Pour qui                                           |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Automatisations natives | Intégré à l'outil    | Règles simples : « si statut change, alors notifier » (Asana, monday.com, Trello) | Toutes les équipes, sans configuration technique   |
| Zapier                  | Plateforme no-code   | Connecte des milliers d'applications entre elles (email, tableur, CRM...)         | Équipes non techniques, besoins ponctuels          |
| Make (ex-Integromat)    | Plateforme no-code   | Scénarios visuels plus avancés, avec conditions et boucles                        | Utilisateurs à l'aise avec des workflows complexes |
| Power Automate          | Plateforme Microsoft | Automatisations intégrées à l'écosystème Microsoft 365                            | Entreprises déjà équipées en Microsoft 365         |

# Trois automatisations à mettre en place dès demain

1

**Alerte de retard automatique**

Déclencheur : date d'échéance dépassée

Action : notifier le responsable + le chef de projet

Outil : Asana / monday.com

2

**Création de tâches récurrentes**

Déclencheur : chaque lundi matin

Action : créer les tâches du rituel hebdomadaire

Outil : automatisation native

3

**Rapport d'avancement automatique**

Déclencheur : chaque vendredi 17h

Action : générer et envoyer un résumé par e-mail

Outil : Zapier / Make

# Bonnes pratiques et pièges à éviter

| À faire                                                                                      | À éviter                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div></div>Automatiser une tâche déjà bien définie et stable</div>                      | <div><div></div>Automatiser un processus encore mal défini</div>                   |
| <div><div></div>Tester une automatisation sur un projet pilote avant de la généraliser</div> | <div><div></div>Multiplier les règles sans vue d'ensemble ni suivi</div>           |
| <div><div></div>Documenter chaque règle active pour l'équipe</div>                           | <div><div></div>Retirer toute vérification humaine sur les actions sensibles</div> |

**À RETENIR**

L'automatisation sert l'équipe, elle ne la remplace pas : elle libère du temps pour la décision, la coordination et le travail de fond.

## Ce qu'il faut retenir

| Module 1                                                                                       | Module 2                                                                                      | Module 3                                                                                            | Module 4                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un projet réussi s'appuie sur un cycle de vie clair et un équilibre qualité-coût-délai assumé. | Le bon outil dépend du profil de l'équipe, pas des fonctionnalités les plus impressionnantes. | Planifier, suivre et prioriser sont trois habitudes à installer en équipe, pas des actions isolées. | Automatiser les tâches répétitives et stables libère du temps pour ce qui compte vraiment. |

**PROCHAINE ÉTAPE**

Choisir un outil, l'essayer sur un seul projet pilote pendant deux semaines, puis l'étendre.
